Spis zawartości

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 2
1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 4
2. INWESTOR. 4
3. INFORMACJA BIOZ. 4
3.1. Zakres i kolejność robót 4
3.2. Przewidywane zagrożenie występujące podczas realizacji robót 4
3.3. Instruktaż pracowników 5
3.4. Techniczno - organizacyjne środki zapobiegawcze 5
ZAŁĄCZNIKI – DECYZJE, ODPINIE, UZGODNIENIA I WARUNKI 6
ZAŁĄCZNIKI – ZIELEŃ 21

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA I ADRES INWESTORA:	*NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ:*
Wójt Gminy Wierzbica *ul. Włodawska 1* *22-150 Wierzbica*	WIKTIS Sp. z o.o. Adres: al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa Adres koresp.,: Ul. Przyjazna 9A, 22-100 Rudka NIP 563 245 48 15, REGON 527 006 486

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI OCHOŻA – PNIAKI OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 841 DO KM 0+785 WRAZ Z PRZEBUDOIWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ

ADRES:

woj. lubelskie, powiat chełmski, gmina Wierzbica

OPRACOWANIE:

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PROJEKTANT OPRACOWUJĄCY:

Stanowisko	Imię i Nazwisko	Adres	Specjalność i nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Artur Łomański	Ul. Przyjazna 9a, 22-100 Rudka	LUB/0002/PBD/16 drogi	

DATA OPRACOWANIA:

CZERWIEC 2025

1. Podstawa Opracowania.

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z 23czerwca 2003r Dz.U. nr 120 poz.1126,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r., w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1518,

2. Inwestor.

Wójt Gminy Wierzbica
ul. Włodawska 1
22-150 Wierzbica

3. Informacja BIOZ.

3.1. Zakres i kolejność robót

Zakres robót przy realizacji projektowanego przedsięwzięcia obejmuje zadania w następującej kolejności:

3.1.1. Wszystkie branże:

- roboty przygotowawcze i porządkowe,
- zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi,
- geodezyjne wytyczenie elementów przedsięwzięcia,
- dostawa materiałów,
- wykonanie wykopów kontrolnych w miejscach skrzyżowania drogi z istniejącymi sieciami,
- uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynności (robót budowlanych) związanych z inwestycją,
- inwentaryzacja powykonawcza.

3.1.2. Branża drogowa:

- zdjęcie humusu, jego załadunek i transportem,
- roboty rozbiórkowe istniejących przepustów i konstrukcji zjazdów wraz z transportem,
- wykonanie wykopów wraz z plantowaniem skarp i transportem,
- wykonanie konstrukcji jezdni,
- wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych,
- wykonanie poboczy,
- zahumusowanie.

3.2. Przewidywane zagrożenie występujące podczas realizacji robót

- wykonanie wykopów koryto drogowe i elementy odwodnienia,
- załadunek, rozładunek, montaż elementów drogowych i kruszyw - możliwość przygniecenia ciężkimi elementami,
- prowadzenie robót w obrębie pasa drogowego przy równocześnie występującym ruchu drogowym- wypadki i zdarzenia drogowe,

- nieostrożne obchodzenie się ze sprzętem,
- zasypanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopu,
- wpadnięcie do wykopu (obsunięcie się ziemi z krawędzi wykopu lub poślizgnięcie się),
- uderzenie pracownika w wykopie spadającą bryłą ziemi, kamieniem lub innym przedmiotem,
- najechanie sprzętem budowlanym (koparki, walce, samochody),

3.3. Instruktaż pracowników

Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w ramach okresowych szkoleń BHP. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (w formie instruktażu) nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których występują duże zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujące pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegają szkoleniom nie rzadziej niż co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym.

Ponadto, bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót związanych z przedmiotową inwestycją należy przeprowadzić indywidualny instruktaż polegający na:

- określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 3.1,
- szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach podczas realizacji robót zgodnie z punktem 3.2,
- przedstawieniu metod postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.

3.4. Techniczno - organizacyjne środki zapobiegawcze

Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące środki:

- oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych,
- stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy
- zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy (wyznaczenie dojścia pracowników, dostawy i miejsca składowania materiałów budowlanych, zejścia do wykopów oraz uwzględnić możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub poszkodowanych),
- wykonać umocnienie ścian wykopów (typ konstrukcji dostosować do głębokości, rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obciążeń transportem, składowaniem materiałów i innych obciążeń w sąsiedztwie wykopów),
- ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić ich odprowadzenie z dna wykopu,
- przed każdorazowym rozpoczęciem robót w wykopie sprawdzić stan skarp, umocnień i zabezpieczeń,
- prace przy skrzyżowaniu z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem osób odpowiadających za dany rodzaj sieci,
- zleca się aby pojazd budowy, w czasie jazdy tyłem, automatycznie wysyłał sygnał dźwiękowy.

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporządzić dla inwestycji plan bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszą informację oraz rysunki i ewentualne inne szczegółowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.

Opracowujący:

ZAŁĄCZNIKI – DECYZJE, ODPINIE, UZGODNIENIA I WARUNKI

Spis załączników		
Lp.	Znak	Nadawca
1	6171/2025	PGE Dystrybucja
2	2503210108/TTDSIKU/IB/01	ORANGE Polska
3	ZLPK-Och.OPK.413.9.2025	Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych
4	Bd.6853.14.2025	Urząd Gminy Wierzbica
5	LBC.4200.121.2025	Wody Polskie
6	UD.410.104.1.2025.wk	ZDW w Lublinie
7	GKN.6630.89.2025	Starosta Chełmski

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Zamość
Rejon Energetyczny Chełm
22-100 Chełm, ul. Trubakowska 61

tel.: (+ 48 84) 539 21 00
fax: (+48 84) 539 21 09
e-mail: sekretariat.rechelm.oz@pgedystrybucja.pl

Chełm, 23 czerwca 2025 r.
L. dz. /617/2025
Egz. nr 1

Wiktis sp. z o.o.
ul. Przyjazna 9A
22-100 Chełm

Dotyczy: Uzgodnienia budowy drogi gminnej w miejscowości Ochoża-Pniaki

RE Chełm uzgadnia budowę drogi gminnej w miejscowości Ochoża-Pniaki od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 841 do km. 0+785 z następującymi uwagami:

1. Przewidzieć do dalszej eksploatacji istniejące linie napowietrzne SN i nN w obrębie opracowania.
2. Budowa drogi może odbywać się zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w PN-E-05100-1 w zakresie linii napowietrznych.
3. Zachować odległości pionowe od projektowanej drogi do linii energetycznych zgodnie z normą PN-E-05100-1, w przypadku braku zachowania wysokości wystąpić do RE Chełm o określenie warunków usunięcia kolizji.
4. Zabrania się wykonywania prac sprzętem zmechanizowanym o zmiennej lokalizacji (np.: dźwigi, podnośniki) w pobliżu czynnej linii SN w odległości mniejszej niż 5m, w pobliżu czynnej linii nN w odległości mniejszej niż 3m.
5. O planowanym terminie wykonania prac powiadomić RE Chełm na min. 7 dni przed rozpoczęciem robót.
6. Po wykonaniu prac zgłosić do odbioru w RE Chełm


PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Zamość
Rejon Energetyczny Chełm
Z-ca Dyrektora
Marcin Karpiuk
podpis, pieczątka


PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 9 729 424 160 ZŁ W PEŁNI OPŁACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl

PGE Dystrybucja S.A.

Wykonano w 2 egzemplarzach
1. Egzemplarz nr 1 – adresat
2. Egzemplarz nr 2 – a/a
Wykonał: Piotr Kawalec

PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 9 729 424 160 ZŁ W PEŁNI OPŁACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl

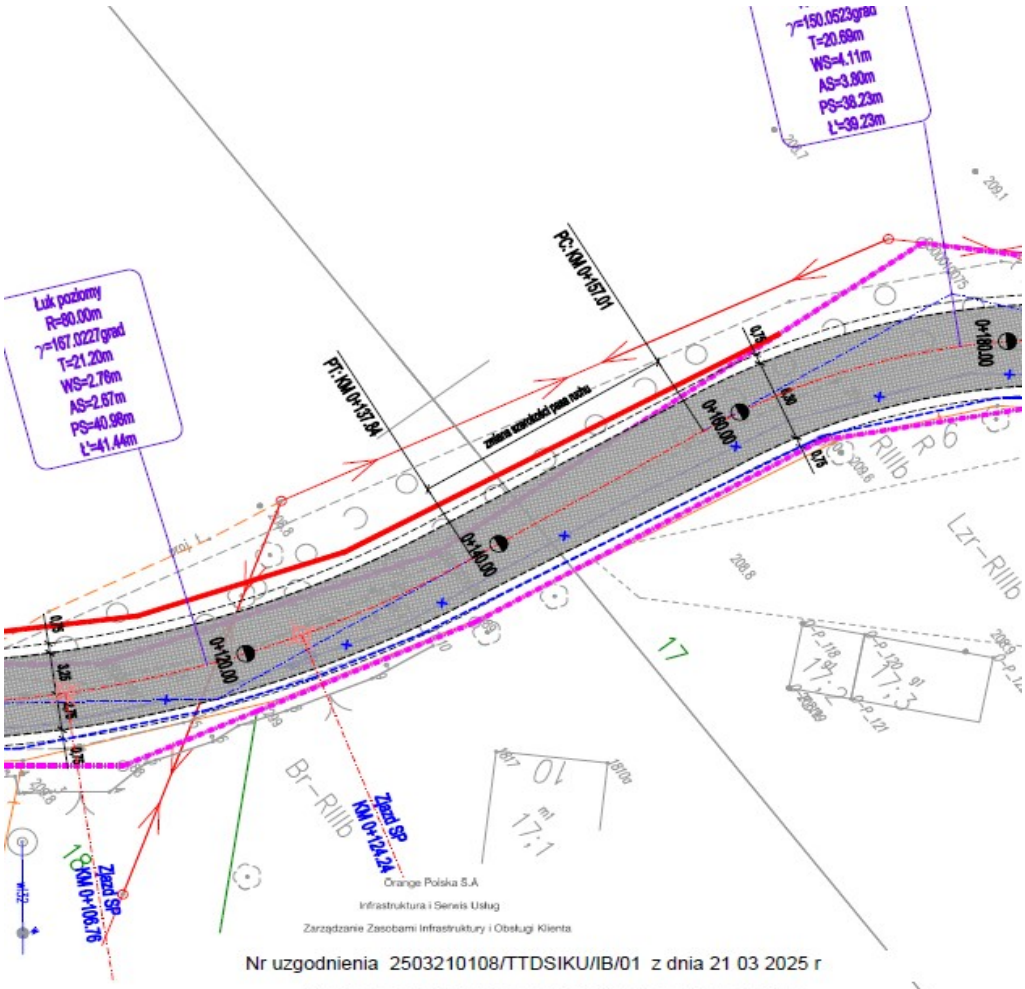
Łuk poziomy
R=80.00m
γ=167.3227grad
T=21.20m
WS=2.76m
AS=2.67m
PS=40.98m
Ł=41.44m
PT:KM 0+157.84
PC:KM 0+457.01
γ=150.0523grad
T=20.69m
WS=4.11m
AS=3.80m
PS=38.23m
Ł=39.23m
zatoka rozwiązki pasa ruchu
0+140.00
0+160.00
0+120.00
0+180.00
0.25
0.5
0.75
4.00
Lzr-RIIIb
RIIIb
R 6
Br-RIIIb
17
18
Zjazd SP
KM 0+106.76
Zjazd SP
KM 0+124.24
Orange Polska S.A
Infrastruktura i Serwis Usług
Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta
Nr uzgodnienia 2503210108/TTDSIKU/IB/01 z dnia 21 03 2025 r
1. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do 1 m od osi istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela Orange Polska.
2. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor
3. Każde wejście na infrastrukturę własności Orange Polska bez złożonego w/w wniosku, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
4. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).
Uzgodnienie jest ważne przez 12 miesięcy..
Ireneusz Bartyka
Czytelny podpis

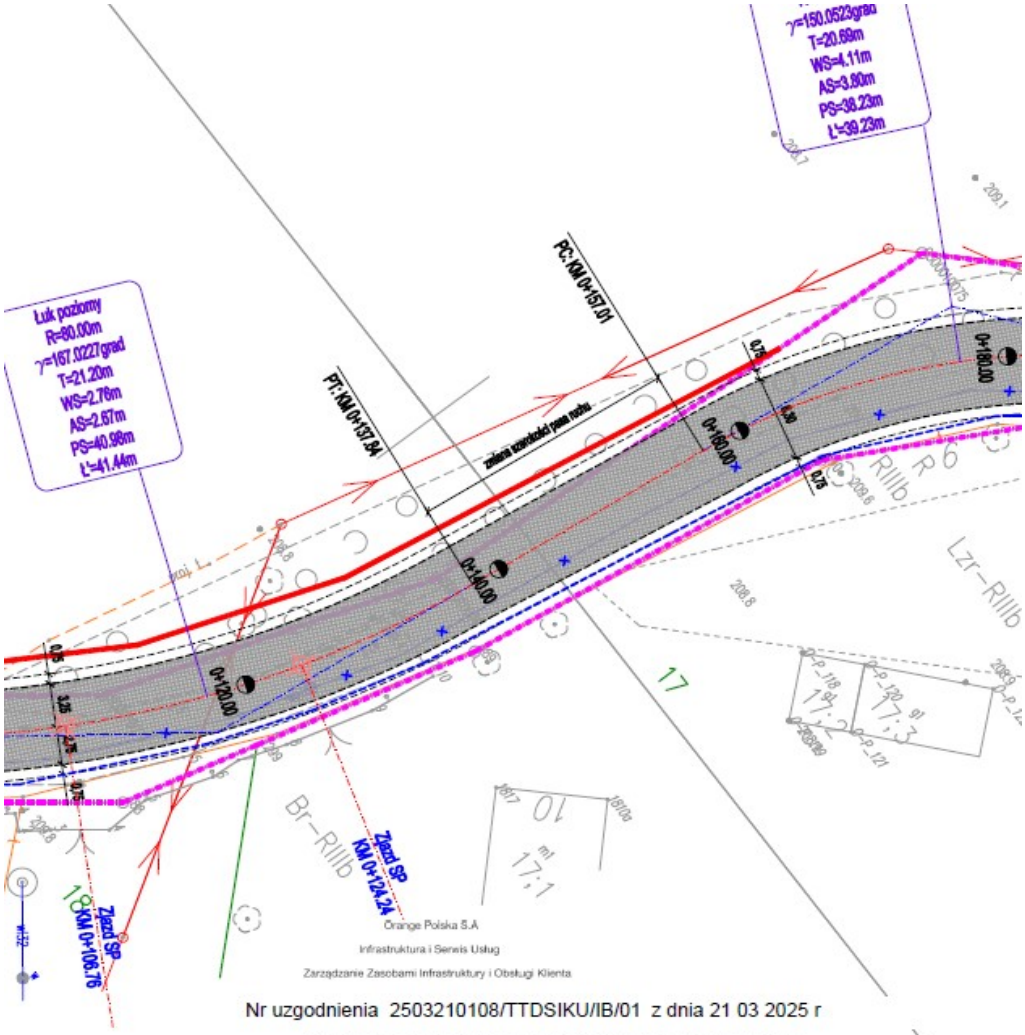

Orange Polska S.A

Infrastruktura i Serwis Usług

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta

Nr uzgodnienia 2503210108/TTDSIKU/IB/01 z dnia 21 03 2025 r

1. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do 1 m od osi istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela Orange Polska.

2. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor

3. Każde wejście na infrastrukturę własności Orange Polska bez złożonego w/w wniosku, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

4. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).
Uzgodnienie jest ważne przez 12 miesięcy..

Ireneusz Bartyka

.....

Czytelny podpis

ZESPÓŁ LUBELSKICH
PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
Oddział w Chełmie

ul. Adama Mickiewicza 37, 22-100 Chełm
tel. 82 540 69 70
e-mail: chelm.zlpk@lubelskie.pl
www.parki.lubelskie.pl

Chełm, dnia 06 maja 2025 r.

ZLPK-OCh.OPK.413.9.2025

Pan
Mgr inż. Artur Łomański
WIKTIS Sp. z o.o.
ul. Przyjazna 9A
22 – 100 Rudka

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20 marca 2025 r., (data wpływu do tut. Oddziału 28.04.2025) znak: 2024.03.Och.03.AŁ dotyczący uzgodnienia inwestycji pn.: **„Budowa drogi gminnej w miejscowości Ochoża – Pniaki od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 841 do km 0+785"**, w związku z opracowaniem zadania polegającego na budowie drogi gminnej w ramach zadania realizowanego przez Gminę Wierzbica, ul. Włodawska 1, 22-150 Wierzbica informuję iż:

Odcinek drogi objęty opracowaniem znajduje się poza granicami obszarów chronionych tj. Parków Krajobrazowych oraz Obszarów Chronionego Krajobrazu, w związku z powyższym Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Oddział w Chełmie nie ma podstaw prawnych do wydania opinii w przedmiotowym zakresie.

z up. DYREKTORA
Zespołu Lubelskich Parków
Krajobrazowych
Justyna Jędruch
Kierownik Oddziału w Chełmie

Instytucja Samorządu
Województwa Lubelskiego

Urząd Gminy Wierzbica
Wierzbica-Osiedle ul. Włodawska 1, 22-150 Wierzbica
województwo lubelskie, powiat chełmski

tel. +48 82 569 32 32
ugwierzbica.bip.lubelskie.pl
www.ugwierzbica.pl ugwierzbica@ugwierzbica.pl

Wierzbica-Osiedle, dnia 28.04.2025 r.

Bd.6853.14.2025

WIKTIS Sp. z o.o.
ul. Przyjazna 9a
22-100 Rudka

W odpowiedzi na wniosek znak: 2024.03.Och.03AŁ z dnia20.03.2025 r. w sprawie uzgodnienia zakresu zadania pn. ***„Budowa drogi gminnej w miejscowości Ochoża-Pniaki od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 841 do km 0+785"*** z siecią wodociągową wskazuje, na kolizje zamierzenia budowlanego z siecią wodociągową ø 160 na odcinku orientacyjnym od km 0+050 do km 0+650 w miejscowości Ochoża-Pniaki oraz podaje niżej wymienione warunki usunięcia kolizji z siecią wodociągową poprzez konieczność jej przebudowy w granicach pasa drogowego na niżej wymienionych warunkach:

1. Warunki przebudowy kolizyjnej sieci wodociągowej:
   a) Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej wykonać z rur PE ø 160 poprzez zgrzewanie doczołowe oraz elektrooporowe w miejscach połączenia z armaturą,
   b) Połączenie wykonać z wykorzystaniem trójnika z wykorzystaniem armatury odcinającej – zasuwa kołnierzowa (zasuwy należy obudować skrzynką do zasuw i obrukować lub rozwiązanie równoważne zamienne o tej samej funkcji i zastosowaniu.

Kolizyjną sieć wodociągową przebudować w granice pasa drogowego pomiędzy jezdnię, a granicę działki drogowej. W przypadku braku możliwości lokalizacji sieci za poboczem drogi, wyraża się zgodę na usytuowanie sieci w poboczu drogi.

2. W ramach prac należy wykonać włączenie przyłączy wodociągowych do przebudowanej sieci za pomocą zasuw klinowych z obejmą oraz wykładziną gumową dla rur PE i PVC typu NWZ PN16 lub równorzędne. Zasuwy należy obudować skrzynką do zasuwy o średnicy 185 mm. Przyłącza zaprojektować z rur PE ø 32 lub 40 na głębokość min. 1,1 m.
3. W miejscu przejścia sieci pod drogą sieć lub przyłącze zabezpieczyć rurą ochronną, przy czym przewód osłonowy wystawić min. 1 m poza zakres jezdni lub skarpy.
4. Warunki wykonania robót:
   a) Na przebudowę sieci wodociągowej należy posiadać projekt zagospodarowania terenu opracowany w 3 egzemplarzach odpowiadający wymogom ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz stosownym przepisom branżowym.

Urząd Gminy Wierzbica
Wierzbica-Osiedle ul. Włodawska 1, 22-150 Wierzbica
województwo lubelskie, powiat chełmski
tel. +48 82 569 32 32
ugwierzbica.bip.lubelskie.pl
www.ugwierzbica.pl ugwierzbica@ugwierzbica.pl

Projekt należy uzgodnić z Urzędem Gminy Wierzbica (Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej).

b) Uzyskać stosowne zezwolenie na realizację robót zgodnie z przepisami Prawa budowlanego wydane przez organ architektoniczno-budowlany Starostwa Powiatowego w Chełmie,
c) Zgłosić zamiar wykonywania prac minimum 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót w zakresie przebudowy sieci wodociągowej,
d) Przewód dostarczający wodę z wodociągu nie wolno łączyć z przewodami dostarczającymi wodę z innych źródeł,
e) Wykonawca robót zobowiązany jest zgłosić do Urzędu Gminy w Wierzbicy:
   - termin planowanego rozpoczęcia robót minimum z 7 dniowym wyprzedzeniem,
   - termin odbioru technicznego prac w wykopie otwartym,
   - zakończenie robót wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą.

Warunki techniczne tracą ważność po upływie 24 miesięcy od daty ich wydania.

WÓJT
Anna Plisiuk

Do wiadomości:

1. Konserwator wodociągu w Wierzbicy
2. a/a

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Nadzór Wodny w Chełmie
Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm
NIP: 5272825616, REGON: 368302575
tel. +48 (82) 565 64 66
e-mail: nw.chelm@wody.gov.pl

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Chełm 12.05. 2025 r.

Znak sprawy: LBC.4200.121.2025

Zaświadczenie o niezgłoszeniu sprzeciwu
do zgłoszenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 423 ust. 9, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z póź. zm.) na wniosek z dnia 30.04.2025 r. Wójta Gminy Wierzbica ul. Włodawska 1 22-150 Wierzbica o wydanie zaświadczenia o niezgłoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego dotyczącego przebudowy lub odbudowy urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych dz. nr 206, 205/1 obręb Kamienna Góra dz. nr 1 obręb Ochoża - Pniaki, gm. Wierzbica pow. chełmski, woj. lubelskie.

Zaświadczam

Iż w dniu 12.05.2025 r. Nadzór Wodny w Chełmie po analizie i weryfikacji złożonego w dniu 30.04.2025r, przez Wójta Gminy Wierzbica - zgłoszenia wodnoprawnego dotyczącego przebudowy lub odbudowy urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie drogowym na dz. nr 206, 205/1 obręb Kamienna Góra oraz dz. nr 1 obręb Ochoża-Pniaki gm. Wierzbica, pow. chełmski, woj. lubelskie. na podstawie art. 423 ust. 10, ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 z późn. zm.) **przyjął powyższe zgłoszenie wodnoprawne** (tzn. nie wniósł sprzeciwu).

Pouczenie

Na podstawie art. 423 ust. 2 i 3, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z póź. zm.) do wykonania czynności, robót lub urządzeń wodnych podlegających obowiązkowi zgłoszenia wodnoprawnego można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ właściwy w sprawach zgłoszeń wodnoprawnych nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Dokonanie zgłoszenia wodnoprawnego nie zwalnia z obowiązku uzyskania uzgodnień i decyzji wymaganych na podstawie przepisów odrębnych.

Po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu wodnoprawnym terminu rozpoczęcia czynności, robót lub urządzeń wodnych podlegających obowiązkowi zgłoszenia wodnoprawnego, zgłoszenie wodnoprawne staje się bezprzedmiotowe.

KIEROWNIK NADZORU WODNEGO
W CHEŁMIE
Marek Kopieniak
(Podpis i pieczęć Kierownika Nadzoru Wodnego)

Otrzymują:
1. Gmina Wierzbica.
2. a/a – PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w Chełmie

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
w LUBLINIE

20-262 Lublin, ul. Dobrzańskiego 3
e-mail: sekretariat@zdw.lublin.pl

Tel.: 81 749 53 00
Fax: 81 749 53 01

UD.410.104.1.2025.wk

Lublin, 2025.05.29.

Wiktis Sp. z o.o.
ul. Przyjazna 9A
22 – 100 Rudka

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania warunków technicznych na budowę skrzyżowania drogi gminnej (działka nr ew. 476) z drogą wojewódzką *nr 841 Cyców – Wierzbica – Staw* w km 20+450 w m. Ochoża – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie podaje następujące warunki:

1. Skrzyżowanie drogi gminnej z drogą wojewódzką nr 841, należy zaprojektować zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. *w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych* (Dz. U. z 2022r., poz. 1518).
2. Skrzyżowanie drogi gminnej z drogą wojewódzką należy zaprojektować pod kątem prostym lub zbliżonym do kąta prostego.
3. Szerokość jezdni na wlocie minimum 5,50 m w odległości, co najmniej 20,0m od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej.
4. Należy zapewnić prawidłowe odwodnienie korpusu drogowego w obrębie projektowanego skrzyżowania. Wody opadowe z przedmiotowej drogi nie mogą spływać na jezdnię drogi wojewódzkiej.

Należy opracować i uzgodnić w tut. Zarządzie:

a. projekt budowlany budowy drogi gminnej (uzgodnienie tut. Zarządu w zakresie włączenia do drogi wojewódzkiej).

Należy, również opracować i uzyskać zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem projektu stałej organizacji ruchu oraz projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót w pasie drogowym drogi wojewódzkiej.

Załącznik: Plan sytuacyjny.

Z-CA DYREKTORA
mgr inż. Piotr Gajewski

Do wiadomości:

1. *Wójt Gminy Wierzbica, ul. Włodawska 1, 22 – 150 Wierzbica.*
2. *RDW w Chełmie.*
3. *Wydział UIR w/m.*

Sprawę prowadzi: Waldemar Krasoń
Tel. 81 749 53 39.

GKN.6630.89.2025

Chełm, dn. 17.06.2025 r.

STAROSTA CHEŁMSKI
22-100 Chełm
ul. Pl. Niepodległości 1

Znak sprawy: GKN.6630.89.2025

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakończonej w dniu 17.06.2025 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:	sieć wodociągowa
Lokalizacja:	Gmina: Wierzbica, Obręb: Ochoża-Pniaki, dz.: 1
Wnioskodawca:	ŁOMAŃSKI ARTUR ul. Rudka 25E, 22-100 Chełm
Inwestor:	URZĄD GMINY WIERZBICA ul. Włodawska 1, 22-150 Wierzbia-Osiedle
Projektant:	- ARTUR ŁOMAŃSKI Inne upr.: budowlane: LUB/0002/PBD/16 - MARIUSZ BURACZYŃSKI Inne upr.: budowlane: LUB/0235/PBS/16
Przewodniczący:	Kaja Bochniak
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	05.06.2025 r.

Dokument wygenerował(a): Kaja Bochniak, dn. 18-06-2025 10:45:51
Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

GKN.6630.89.2025

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodniono pozytywnie z uwagami

W wyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	**Starostwo Powiatowe w Chełmie, Wydział Infrastruktury** elektroniczny	**Stanowisko pozytywne** Nie dotyczy	**Magdalena Kubiak**
2	**Orange Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Usług, Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Katowice**	**Uczestnik nieobecny na naradzie**	
3	**Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Chełmie**	**Uczestnik nieobecny na naradzie**	
4	**PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość RE Chełm** elektroniczny	**Stanowisko pozytywne** 1. Przewidzieć do dalszej eksploatacji wszystkie istniejące sieci napowietrzne i kablowe przebiegające w zakresie opracowania projektowego. 2. Projektowane skrzyżowania i zbliżenia z istniejącą elektroenergetyczną siecią kablową wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa. 3. Prace ziemne w pobliżu czynnych kabli elektroenergetycznych nN (do foli ostrzegawczej) należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Naruszoną folię ostrzegawczą odtworzyć. 4. Nie można spowodować wypłycenia linii kablowych. 5. Miejsca zabezpieczeń urządzeń energetycznych bezwzględnie podlegają odbiorowi przed zasypaniem 6. Projektowane skrzyżowania i zbliżenia z istniejącą elektroenergetyczną siecią napowietrzną wykonać zgodnie z normą PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 7. Zabrania się wykonywania prac sprzętem zmechanizowanym o zmiennej lokalizacji (np.: dźwigi, podnośniki, koparki) w pobliżu czynnej linii SN w odległości mniejszej niż 5m a w pobliżu czynnej linii nN w odległości mniejszej niż 3m. W przypadku nie zachowania wymogów - wystąpić do RE Chełm z odrębnym pismem o określenie warunków przebudowy urządzeń.	**Dariusz Śnieg**
5	**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie ul. A. Mickiewicza 37 22-100 Chełm** elektroniczny	**Stanowisko pozytywne** Uzgadniam pod warunkiem uzyskania pozytywnej decyzji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie.	**Dariusz Ruszczuk**
6	**Blue Dot sp. z o.o. Paweł Walczuk s.c. ul. Bolesława Wirskiego 2 22-100 Chełm**	**Uczestnik nieobecny na naradzie**	

Dokument wygenerował(a): Kaja Bochniak, dn. 18-06-2025 10:45:51
Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

GKN.6630.89.2025

7	**FIBEE IV Sp. z o.o.** **ul. Wierzbowa 84** **Wysogotowo** **62-081 Przeźmierowo** elektroniczny	**Stanowisko pozytywne** FIBEE IV SP Z O.O. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62- 081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 10.06.2025 r., we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura FIBEE IV SP Z O.O. będąca w kolizji z opracowywanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia FIBEE IV SP Z O.O. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić FIBEE IV SP Z O.O. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.	**Agnieszka Krasoń**
8	**Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii** **ul. Mieczysława Karłowicza 4,** **20-027 Lublin** elektroniczny	**Stanowisko pozytywne** Projekt nie koliduje z przebiegiem SSPW	**Monika Pajurek**
9	**Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie** elektroniczny	**Stanowisko pozytywne** Nie dotyczy	**Damian Włodarczyk**
10	**Starostwo Powiatowe w Chełmie, Wydział Architektury i Budownictwa** elektroniczny	**Stanowisko pozytywne**	**Barbara Rybak**
11	**Starostwo Powiatowe w Chełmie, Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami** elektroniczny	**Stanowisko pozytywne**	**Kaja Bochniak**
12	**Wójt Gminy Wierzbica** **Ul. Włodawska 1** **22-150 Wierzbica**	**Uczestnik nieobecny na naradzie**	

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: M34035Bc2-SP10410.

Z upoważnienia Starosty Chełmskiego
Kaja Bochniak

Kaja Bochniak
Elektronicznie podpisany przez Kaja Bochniak
Data: 2025.06.18 10:56:13 +02'00'

.....

Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1151). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1151).

3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1151).

Dokument wygenerował(a): Kaja Bochniak, dn. 18-06-2025 10:45:51
Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

Rudka, 24.06.2025

Oświadczenie

Oświadczam, że załączone do przedmiotowego opracowania warunki techniczne, uzgodnienia, opinie i decyzje dotyczą przedmiotowego zadania pn. **Budowa drogi w miejscowości Ochoża – Pniaki od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 841 do km 0+785**.

Projektant

mgr inż. Artur Łomański

ZAŁĄCZNIKI – ZIELEŃ
