
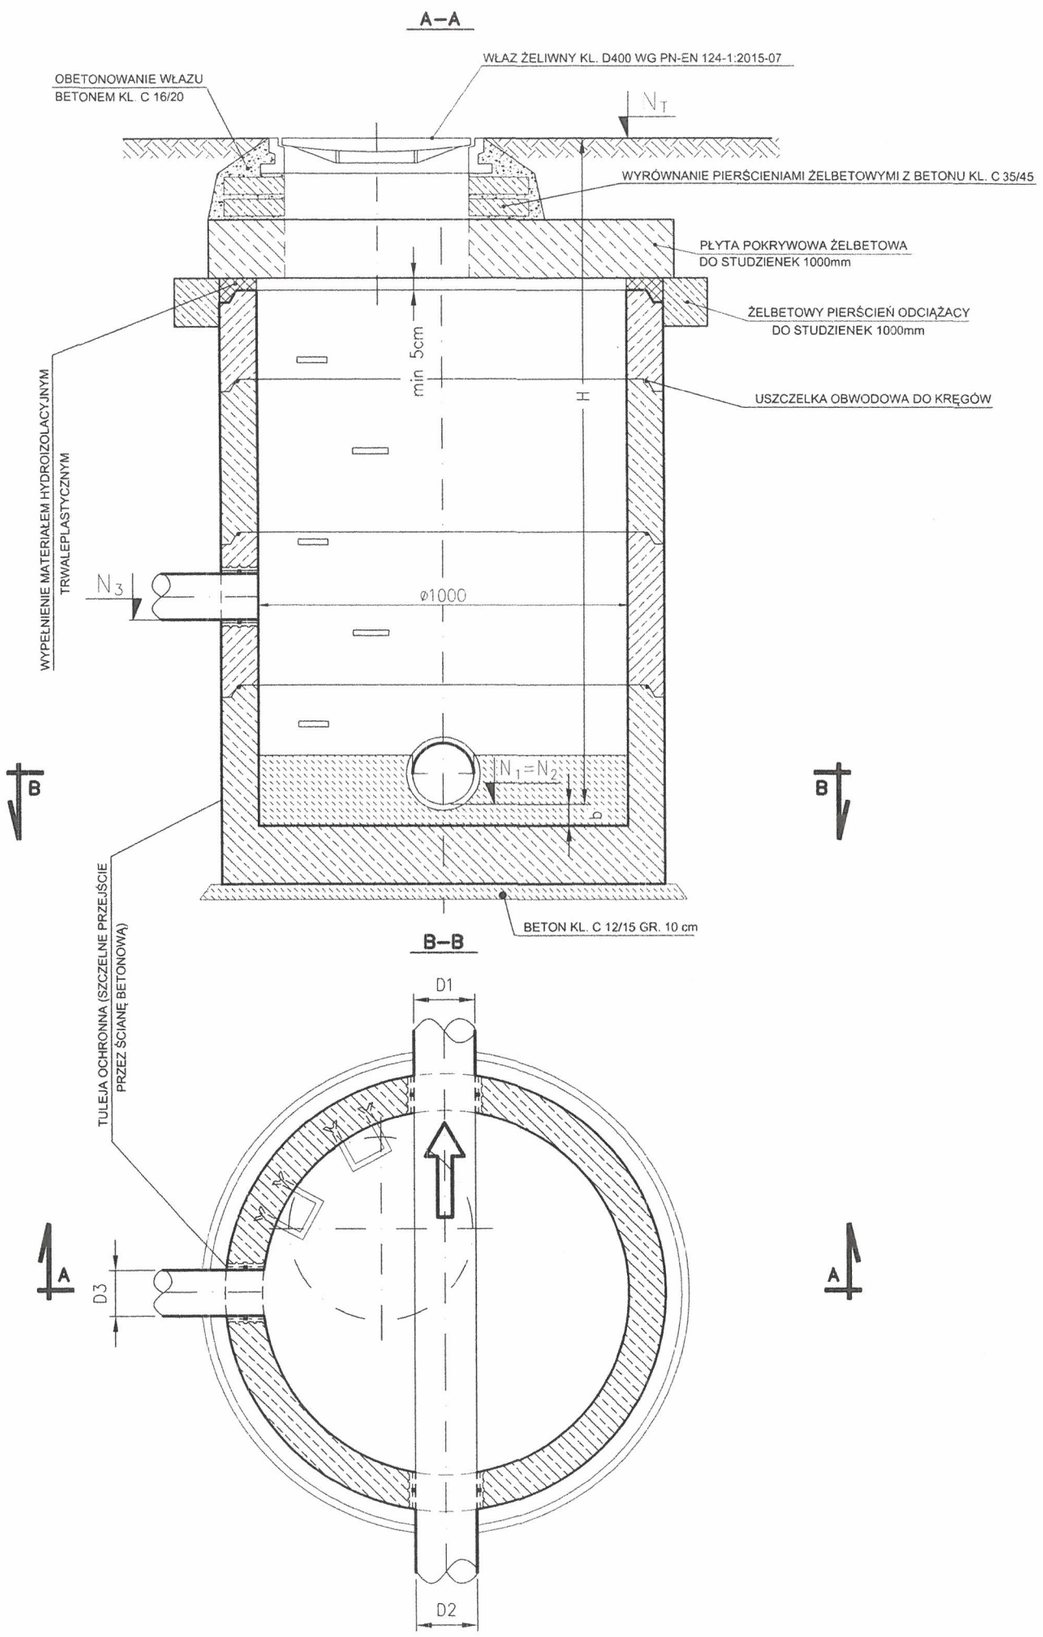




NR ST.	SCHEMATY POŁĄCZEŃ W STUDZIENCE	D1	D2	D3	TYP WŁAZU	N_T	N_1	N_2	H	N_3
	[-]	[mm]			[-]	m n.p.m.			[m]	m n.p.m.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
D1		ø0,30 ISTN.	ø0,30 ISTN.	D200	D400 ø600	102,96	99,78	99,78	3,18	100,76

UWAGI:
1. STUDZIENKA WG PN-EN 1917:2004
2. POŁĄCZENIA KANAŁÓW - OŚ W OŚ, WŁĄCZENIE PRZYKANALIKA - ZGODNIE Z RZĘDNYMI
3. KRĘGI ŻELBETOWE ŁĄCZONE NA USZCZELKI GUMOWE
4. b = 7 cm
5. DOLNĄ CZĘŚĆ STUDZIENKI WYKONAĆ W FORMIE PREFABRYKATU
6. KRĘGI ŻELBETOWE I PREFABRYKATY NALEŻY WYKONAĆ Z BETONU C 35/45
7. ZEWNĘTRZNE ŚCIANY STUDZIENKI POSMAROWAĆ NA CAŁEJ WYSOKOŚCI ABIZOLEM R+2xKL
8. WEWN. POWIERZCHNIE ŚCIAN STUDZIENKI ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE
9. STOPNIE ZŁAZOWE DO STUDZIENEK KONTROLNYCH WG PN-EN-13101
10. KINETA PRZEPŁYWOWA Z BETONU KL. C 40/50
11. WŁAZ ŻELIWNY WENTYLOWANY KLASY D400/Ø600 ZATRZASKOWY NA ZAWIASACH WG PN-EN 124-1:2015-07
12. USYTUOWANIE STUDZIENKI WG RYS. PLANU SYTUACYJNEGO

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH "KANPRO" inż Jan Wojcieski 03-752 Warszawa ul. Radzymińska 36/38/40 m. 11 tel. 601-167-317 e-mail: kanpro1@wp.pl Regon 010389763; NIP 536-100-52-86	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
	Projektował	**mgr inż. Sebastian Wojcieski**	MAZ/1005/ PWBS/19	
	Sprawdził	**inż. Jan Wojcieski**	St-596/86	

Temat (Obiekt)	Branża	Data
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY PRZYKANALIKÓW DESZCZOWYCH ODPROWADZAJĄCYCH WODY OPADOWE Z RUR SPUSTOWYCH (RYNIEN) ZADASZENIA TRYBUN MOSiR PRZY ULICY HARCERSKIEJ W PIASTOWIE	TECHNOLOGIA + KONSTRUKCJA	09.2026 r.
	Nr umowy	
	0131/273/2026	
Nazwa rysunku **SCHEMAT STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ REWIZYJNEJ POŁĄCZENIOWEJ Z KRĘGÓW ŻELBETOWYCH Ø1,0m**	Nr rysunku **4**	Skala —

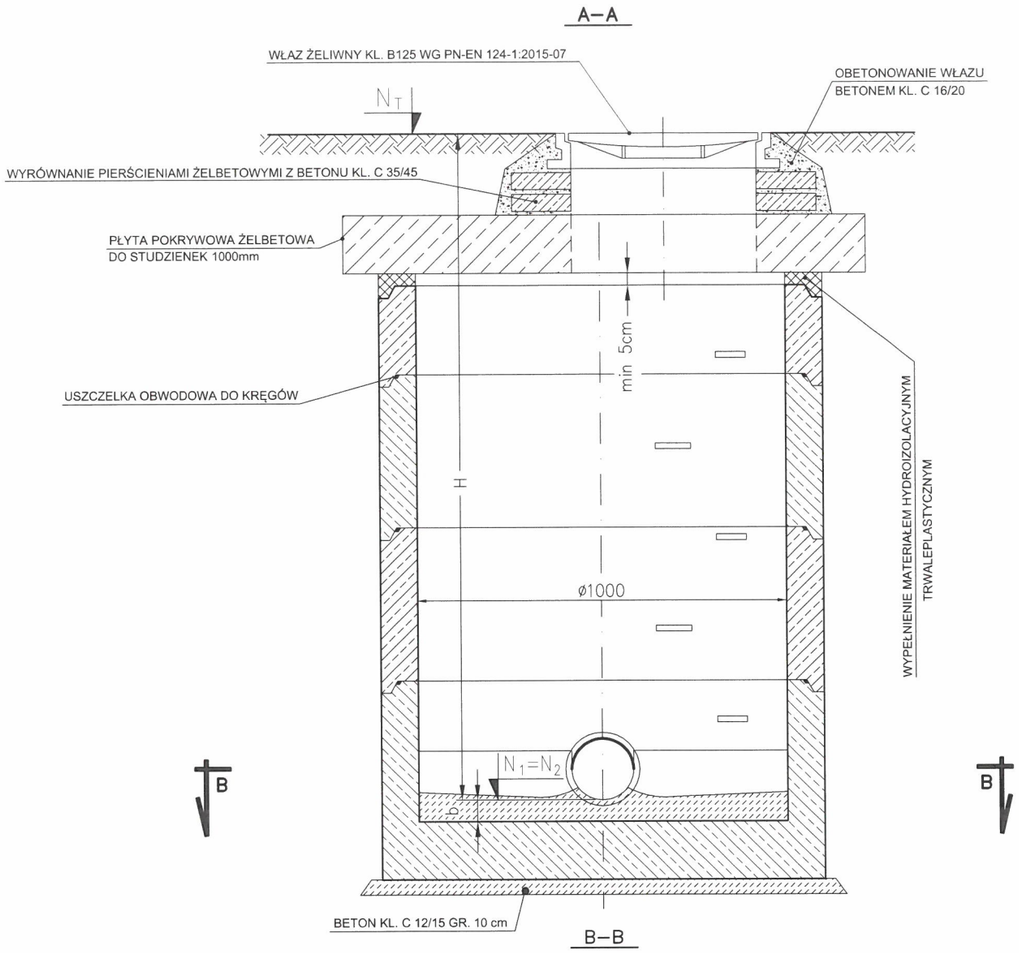

NR ST.	SCHEMAT POŁĄCZEŃ W STUDZIENCE	D1	D2	TYP WŁAZU	N_T	N_1	N_2	H
	[–]	[mm]		[–]	m n.p.m.			[m]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D2		D200	D200	B125 ø600	102,39	100,86	100,86	1,53

UWAGI:
1. STUDZIENKA WG PN-EN 1917:2004
2. POŁĄCZENIA PRZYKANALIKÓW OŚ W OŚ
3. KRĘGI ŻELBETOWE ŁĄCZONE NA USZCZELKI GUMOWE
4. b = 7 cm
5. DOLNĄ CZĘŚĆ STUDZIENKI WYKONAĆ W FORMIE PREFABRYKATU
6. KRĘGI ŻELBETOWE I PREFABRYKAT NALEŻY WYKONAĆ Z BETONU C 35/45
7. ZEWNĘTRZNE ŚCIANY STUDZIENKI POSMAROWAĆ NA CAŁEJ WYSOKOŚCI ABIZOLEM R+2xKL
8. WEWN. POWIERZCHNIE ŚCIAN STUDZIENKI ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE
9. STOPNIE ZŁAZOWE DO STUDZIENEK KONTROLNYCH WG PN-EN-13101
10. KINETA PRZEPŁYWOWA Z BETONU KL. C 40/50
11. WŁAZ ŻELIWNY WENTYLOWANY KLASY B125/Ø600 ZATRZASKOWY NA ZAWIASACH WG PN-EN 124-1:2015-07
12. USYTUOWANIE STUDZIENKI WG RYS. PLANU SYTUACYJNEGO

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH "KANPRO"
inż Jan Wojcieski
03-752 Warszawa
ul. Radzymińska 36/38/40 m. 11
tel. 601-167-317
e-mail: kanpro1@wp.pl
Regon 010389763; NIP 536-100-52-86

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował	**mgr inż. Sebastian Wojcieski**	MAZ/1005/ PWBS/19	
Sprawdził	**inż. Jan Wojcieski**	St-596/86	

Temat (Obiekt)

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY PRZYKANALIKÓW DESZCZOWYCH ODPROWADZAJĄCYCH WODY OPADOWE Z RUR SPUSTOWYCH (RYNIEN) ZADASZENIA TRYBUN MOSiR PRZY ULICY HARCERSKIEJ W PIASTOWIE

Branża	Data
TECHNOLOGIA + KONSTRUKCJA	09.2026 r.


Nr umowy: **0131/273/2026**

Nazwa rysunku

SCHEMAT STUDZIENKI REWIZYJNEJ PRZELOTOWEJ Z KRĘGÓW ŻELBETOWYCH Ø1,0m






Nr rysunku	Skala
5	——

Studzienka kanalizacyjna D425 niewłazowa

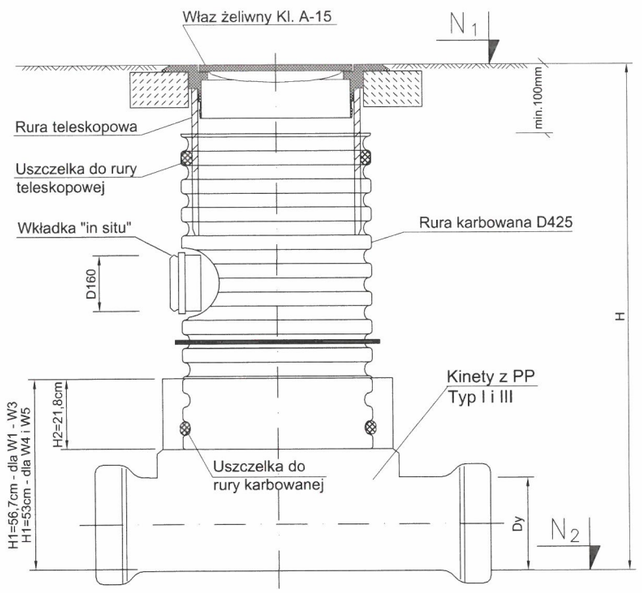


UWAGI:

1. *WŁAZY I INNE ELEMENTY STUDZIENEK - TYPOWE WG KATALOGU PRODUCENTA*
2. *WŁ. ZA POMOCĄ WKŁADEK "IN SITU" WYKONAĆ ZGODNIE Z WYM. PRODUCENTA STUDZIENEK*
3. *POSADOWIENIE STUDZIENEK NA PODSYPCE Z ZAGĘSZCZONEGO PIASKU GR. 20 cm*


NR ST.	SZKIC POŁĄCZ.	Dy [mm]	N_1 m. npm	N_2 m. npm	H [cm]	KINETA STUDZIENKI TYP I	TYP II	TYP III	TYP IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
W1		D200	102,44	100,98	146	1	–	–	–
W2		D200	102,37	101,10	127	1	–	–	–
W3		D200	102,42	101,22	120	1	–	–	–
W4		D160	102,66	101,10	156	–	–	1	–
W5		D160	102,48	101,28	120	1	–	–	–

Kinety studzienek inspekcyjnych z PP z uszczelką


Typ I przepływowa

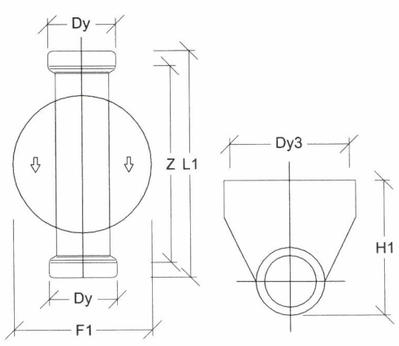


Typ II połączeniowa (dopływ prawy i lewy)

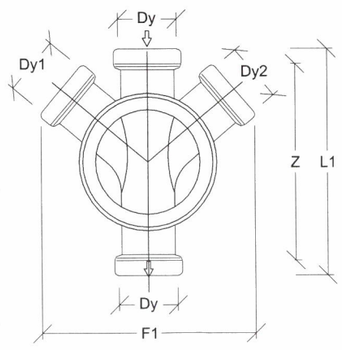

Typ III połączeniowa (dopływ lewy)

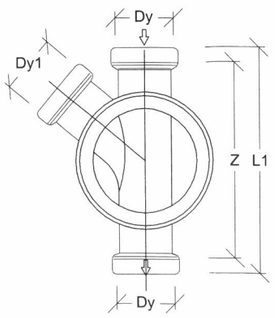

Typ IV połączeniowa (dopływ prawy)

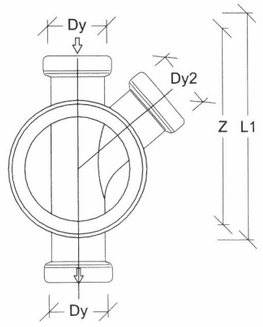

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH "KANPRO" inż Jan Wojcieski	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
03-752 Warszawa, ul. Radzymińska 36/38/40 m. 11, tel. 601-167-317, e-mail: kanpro1@wp.pl, Regon 010389763; NIP 536-100-52-86	Projektował	**mgr inż. Sebastian Wojcieski**	MAZ/1005/ PWBS/19	
	Sprawdził	**inż. Jan Wojcieski**	St-596/86	

Temat (Obiekt)	Branża	Data
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY PRZYKANALIKÓW DESZCZOWYCH ODPROWADZAJĄCYCH WODY OPADOWE Z RUR SPUSTOWYCH (RYNIEN) ZADASZENIA TRYBUN MOSiR PRZY ULICY HARCERSKIEJ W PIASTOWIE	TECHNOLOGIA + KONSTRUKCJA	09.2026 r.
	Nr umowy	**0131/273/2026**
Nazwa rysunku: **SCHEMATY STUDZIENEK INSPEKCYJNYCH D425 Z PP**	Nr rysunku: **6**	Skala: ——
