WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW w Szczecinie
Delegatura w Koszalinie
Dnia 12. 11. 2025
WPŁYNĘŁO
nr .....

Darłowo-zamek
Stanowisko/a nr
A-736
Numer rej.
Darłowo
Gmina

Sprawozdanie z badań archeologicznych

Znak decyzji:	ZArch.K.5161.158.2025.EK
Numer decyzji:	832.2025.K
Decyzja z dnia:	1 października 2025 r.
Termin badań:	23 października 2025 r.
Prowadzący badania:	Mgr Marcin Krzepkowski
Teren badań:	512/2 obr. 010 Darłowo
Inwestycja:	Badania geologicznymi w ramach zadania „Projekt zmiany poszycia dziedzińca Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie”

Wynik badań: pozytywny

Poznań, 2025

Archeologiczne badania interwencyjne nad badaniami geologicznymi w ramach zadania „Projekt zmiany poszycia dziedzińca Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie”, wykonane zostały zgodnie z zakresem prac archeologicznych określonych decyzją o sygnaturze Zarch.K.5161.158.2025.EK wydanej dnia 1 października 2025 roku przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie Delegatura w Koszalinie. Obszar prac znajdował się w obrębie dziedzińca zamku gotyckiego, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-736 (dawny nr 2) dnia 20 czerwca 1952 roku. Zleceniodawcą badań był Zamek Książąt Pomorskich-Muzeum w Darłowie, ul. Zamkowa 4, 76-150 Darłowo, wykonawcą fima Gotyk sp.z o.o., ul. Wszystkich Świętych 5b, 71-457 Szczecin.

Pracami archeologicznymi, kierował mgr Marcin Krzepkowski, Fundacja Relicta, os. Batorego 82”o”/14, 60-678 Poznań. Prace terenowe realizował mgr Andrzej Kuczkowski.

Cel i zakres badań

Cel

- rejestracja wziemnych reliktów archeologicznych
- rejestracja pionowego i poziomego układu stratygraficznego
- pozyskanie ruchomego materiału zabytkowego

Zakres

- rejestracja i eksploracja warstw kulturowych i obiektów.
- rejestracja fotograficzna, opisowa oraz rysunkowa sytuacji stratygraficznej.
- wykonanie dokumentacji konserwatorskiej z nadzoru i badań zgodnie ze standardami sporządzania dokumentacji określonej przez Generalnego Konserwatora Zabytków.
- wykonanie konserwacji i dokumentacji pozyskanego materiału ruchomego

Przebieg prac badawczych

Nadzorem archeologicznym objęto prace ziemne związane z badaniami geologicznymi, mającymi na celu rozpoznanie nawarstwień zalegających pod współczesną nawierzchnią dziedzińca zamkowego.

Wykonano dwie odkrywki o wymiarach 0,3×0,3 m. Po osiągnięciu spągu współczesnej podbudowy nawierzchni na głębokości około 60 cm, wykonano wiercenia geologiczne, dzięki którym zadokumentowano nawarstwienia związane z funkcjonowaniem średniowiecznego zamku.

Profile otworów wiertniczych (dane z odkrywek).

<u>Otwór (odkrywka A)</u> (rzędna 6,05 m n.p.m.)

0,0 – 0,55 NN (bruk+Pd)	– warstwa nasypowa, bruk leżący na pospółce i piasku średnim żółtym (**I_D = 0,40 – 0,45**). Poniżej warstwa wylewki betonowej,
0,55 – 1,3 NN(H+Pd+G+ceg,+wap.)	– warstwa nasypowa składająca się na mieszaninę humusu z gliną i gruzem ceglanym przechodzącym w drobny gruz ceglany z zaprawą wapienną, średniozagęszczony (**ID = 0,40**),
1,3 – 1,9 NN (G+H, G)	– glina brązowoszara z domieszką humusu oraz śladami pożarowymi plastyczna (**IL = 0,35**), przechodząca w glinę, wilgotną, brązową, twardoplastyczną (**IL = 0,20**),
1,9 – 2,5 G	– glina szara, wilgotna, twardoplastyczna (**IL = 0,20**),
2,5 – 2,7 Nm	– namuł organiczny, wilgotny, ciemnoszary, plastyczny (**IL = 0,40**),
2,7 – 2,9 G	– glina szara, wilgotna , twardoplastyczna (**IL = 0,20**),
2,9 – 3,0 Gp+Ż	– glina piaszczysta z domieszką żwirów, wilgotna, szara twardoplastyczna (**IL = 0,10**).


<u>Otwór (odkrywka B)</u> (rzędna 6,10 m n.p.m.)

0,0 – 0,35 NN (bruk+Pd)	– warstwa nasypowa, bruk leżący na piasku drobnym, wilgotnym żółtym (**I_D = 0,30**). Poniżej warstwa wylewki betonowej,
0,35 – 1,0 NN(Pd+H+G+ceg,+wap.)	– warstwa nasypowa składająca się na mieszaninę humusu z gliną i gruzem ceglanym przechodzącym w drobny gruz ceglany z zaprawą wapienną, średniozagęszczony (**ID = 0,35**),

1,0 – 1,5 NN (G+Pd+ceg.) – glina brązowoszara z domieszką piasku oraz śladami pożarowymi, plastyczna (**IL = 0,35**), przechodząca w glinę, wilgotną, brązową

1,5 – 2,3 NN (G) – glina brązowa, wilgotna twardoplastyczna (**IL = 0,20**).

Nie pozyskano żadnego zabytkowego materiału ruchomego.

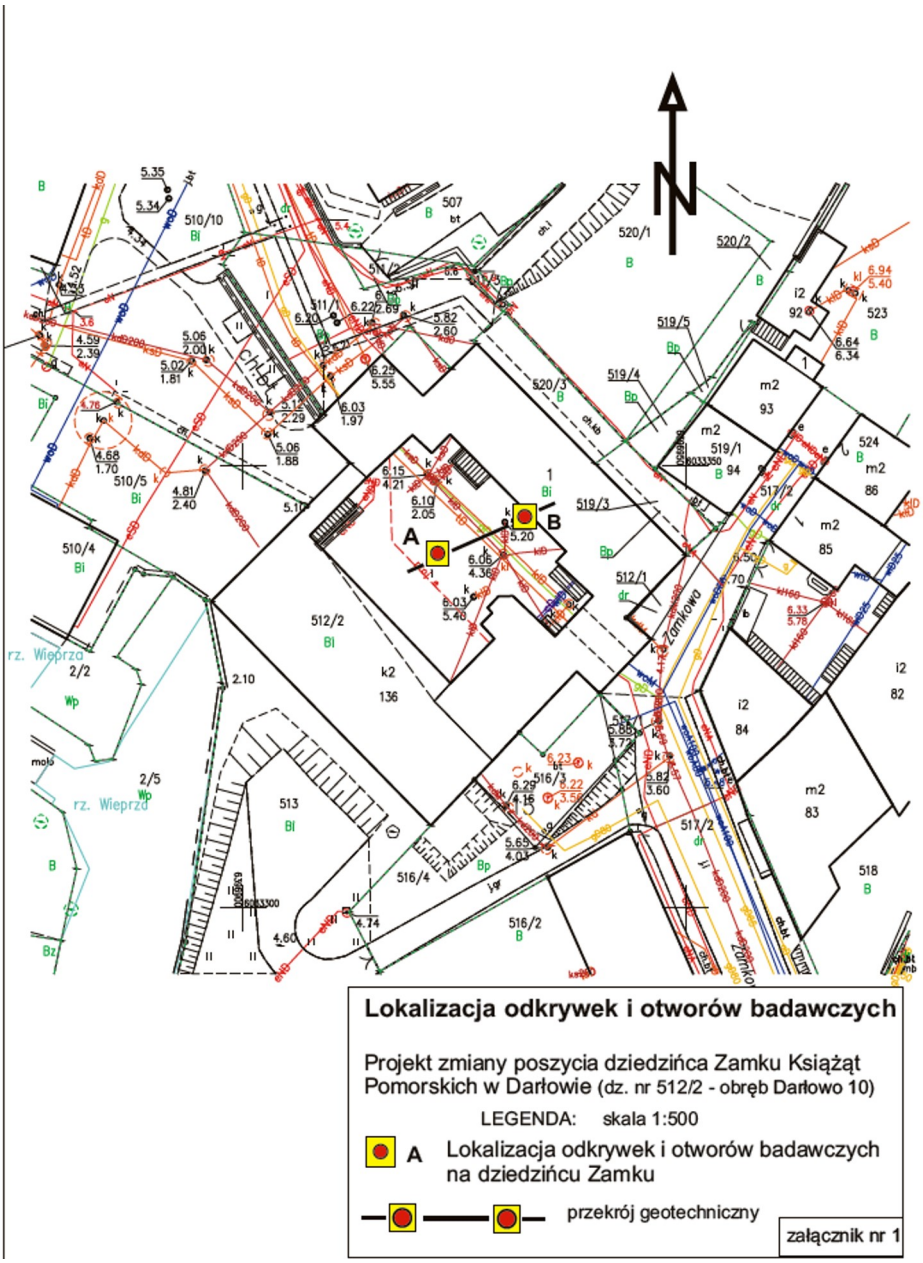

Z badań zostało sporządzone opracowanie tekstowe wraz z dokumentacją fotograficzną w postaci 4 kart inwentarzowych.

Sprawozdanie z wykonanych prac zostało przekazane: 1 egz. dla Wykonawcy, 1 egz. dla WUOZ w Szczecinie Delegatura w Koszalinie.

KARTA FOTOGRAFII



Miejscowość: Darłowo

Powiat: sławieński

Województwo: zachodniopomorskie

stanowisko	Nr inw.	data
Darłowo-zamek	1/25	23 października 2025 r.

Badania geologiczne w ramach zadania „Projekt zmiany poszycia dziedzińca Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie”

Odkrywka A – miejsce wytypowane do badań przed ich rozpoczęciem

Uwagi: decyzja WUOZ w Szczecinie Delegatura w Koszalinie Zarch.K.5161.158.2025.EK.

KARTA FOTOGRAFII



Miejscowość: Darłowo

Powiat: sławieński

Województwo: zachodniopomorskie

stanowisko	Nr inw.	data
Darłowo-zamek	2/25	23 października 2025 r.

Badania geologiczne w ramach zadania „Projekt zmiany poszycia dziedzińca Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie”

Odkrywka A – widok na odkrywkę po usunięciu współczesnej podbudowy nawierzchni dziedzińca

Uwagi: decyzja WUOZ w Szczecinie Delegatura w Koszalinie Zarch.K.5161.158.2025.EK.

KARTA FOTOGRAFII



Miejscowość: Darłowo

Powiat: sławieński

Województwo: zachodniopomorskie

stanowisko	Nr inw.	data
Darłowo-zamek	3/25	23 października 2025 r.

Badania geologiczne w ramach zadania „Projekt zmiany poszycia dziedzińca Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie”

Odkrywka B – miejsce wytypowane do badań przed ich rozpoczęciem

Uwagi: decyzja WUOZ w Szczecinie Delegatura w Koszalinie Zarch.K.5161.158.2025.EK.

KARTA FOTOGRAFII



Miejscowość: Darłowo

Powiat: sławieński

Województwo: zachodniopomorskie

stanowisko	Nr inw.	data
Darłowo-zamek	4/25	23 października 2025 r.

Badania geologiczne w ramach zadania „Projekt zmiany poszycia dziedzińca Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie”

Odkrywka B – widok na odkrywkę po usunięciu współczesnej podbudowy nawierzchni dziedzińca

Uwagi: decyzja WUOZ w Szczecinie Delegatura w Koszalinie Zarch.K.5161.158.2025.EK.
